

REGIONE CAMPANIA



COMUNE DI LAVIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Interventi di Riqualficazione e Messa in Sicurezza di
Via E. Berlinguer del Comune di Laviano (SA)

CUP: H69J19000040001

PROGETTO DEFINITIVO ed ESECUTIVO

COMMITTENTE

COMUNE DI LAVIANO (SA)

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.PP.

Geom. Giuseppe MOLINARO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe MOLINARO

PROGETTAZIONE

Geom. Giuseppe MOLINARO

CONSULENZA SPECIALISTICA

Area Tecnica Urbanistica e Patrimonio - Largo Padre Pio n. 1 - 84020 Laviano (SA)
Telefono +39.0828.905001 - Fax +39.0828.915400 - mail: utcomuneditlaviano@tiscali.it

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Codice elaborato:

PE_I

Rev:



03 - 2019


Nome file:


Scala:

1:000

03	PROGETTO DEFINITIVO ed ESECUTIVO	MARZO 2019		
02	STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	07-03-2019	G. C. n. 31-2019	12-03-2019
00	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	06-03-2019	G. C. n. 21-2019	26-02-2019
Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato	Data

		Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1		INTERVENTI DI MESSA IN SICU..	105 giorni	15/05/19 7.00	08/10/19 17.00		
2		Installazione cantiere e recinzioni	2 giorni	15/05/19 7.00	16/05/19 17.00		
3		Opere di scavo, livellamento e de...	4 giorni	17/05/19 8.00	22/05/19 17.00	2	
4		Armatura e cassetatura fondazio...	4 giorni	23/05/19 8.00	28/05/19 17.00	3	
5		Getto fondazioni	1 giorno	29/05/19 8.00	29/05/19 17.00	4	
6		Casseratura ed armatura cordolo	4 giorni	30/05/19 8.00	04/06/19 17.00	5	
7		Getto cordolo	1 giorno	05/06/19 8.00	05/06/19 17.00	6	
8		Maturazione calcestruzzo	28 giorni	06/06/19 8.00	15/07/19 17.00	7	
9		Posa in opera di cordoli in cls	15 giorni	06/06/19 8.00	26/06/19 17.00	7	
10		Opere di rinterro e livellamento m...	2 giorni	27/06/19 8.00	28/06/19 17.00	9	
11		Armatura marciapiede lato sx sal...	5 giorni	01/07/19 8.00	05/07/19 17.00	10	
12		Getto calcestruzzo marciapiade	2 giorni	08/07/19 8.00	09/07/19 17.00	11	
13		Maturazione calcestruzzo	28 giorni	10/07/19 8.00	16/08/19 17.00	12	
14		Pulizia pozzetti stradali	5 giorni	19/08/19 8.00	23/08/19 17.00	13	
15		Posa in opera di manufetti in ghisa	3 giorni	26/08/19 8.00	28/08/19 17.00	14	
16		Posa in opera di parapetto	4 giorni	16/07/19 8.00	19/07/19 17.00	8	
17		Pitturazioni e trattamenti	2 giorni	22/07/19 8.00	23/07/19 17.00	16	
18		Pavimentazioni marciapiedi	30 giorni	19/08/19 8.00	27/09/19 17.00	13	
19		Accertamento ultimazione lavori	2 giorni	30/09/19 8.00	01/10/19 17.00	18	
20		Pulizia e smontaggio cantiere	5 giorni	02/10/19 8.00	08/10/19 17.00	19	

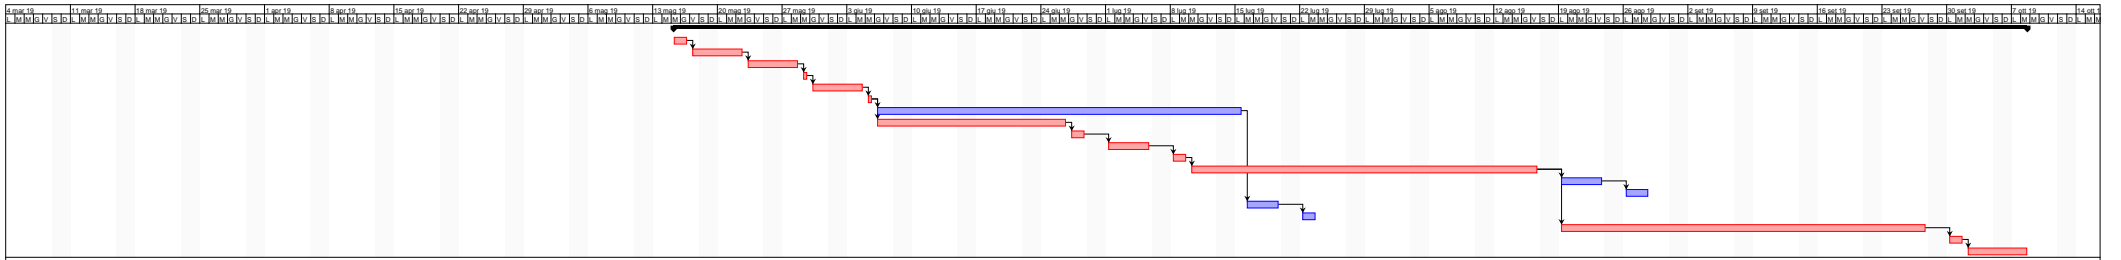



--	--	--
